

1110306 { 土城區 } 物體飛落職災實錄

一、案情經過

111年3月6日中午12時許，韓○有限公司所僱勞工范○○行經A棟地上1樓拆除區通道時，遭地上3樓牆面剝落之混凝土塊砸傷後腦，經送往土城醫院急救後，已出院返家休養。


二、防災對策

雇主於拆除構造物時，構造物有飛落、震落之虞者，應優先拆除，以避免物體飛落危害勞工。

三、照片說明



說明：施工現場圖。

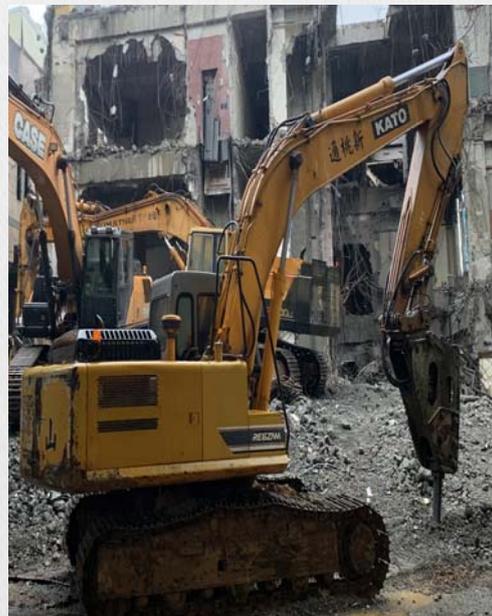

說明：構造物有飛落之虞，應優先拆除。

